

Inspectierapport

conform NEN2990+C1:2020

Pagina 1 van 6

Opdrachtcode Eurofins Asbestos Inspections: A240901077A

Versie 1

Project gegevens

Opdrachtgever	Lagemaat Milieu B.V.
Contactpersoon	[REDACTED]
Projectnummer	24WSTG033-2
Locatie adres	Reinaerdshof 45 Barneveld
Datum	18-09-2024
Overige omschrijving	Betreft containment in de badkamer op de 1e verdieping.

Werkzaamheden

Naam inspecteur	[REDACTED]	
Aankomsttijd	12:10	
Vertrektijd	15:10	
Aardsanering / saneringsklasse	Containment / Lucht-eindcontrole na risicoklasse 2 sanering	
Inventarisatie bureau	Rapportnummer	Versie
BME	276349	1.0

Verwijderde bronnen

Bron	Locatie/bouwdeel	Materiaal	Vezelsoort + gehalte	Omvang	HB	Opmerking
1275-001	Badkamer	Tegellijm, wandtegels	Chrysotiel(0,1 - 2%)	1 m2	Ja	23 m2 is reeds vrijgegeven.

HB = Hechtgebonden

Genomen monsters**Codering**

FCM luchtmonsters	Ja	F10, F11
-------------------	----	----------

Blijft er (verdacht) asbesthoudend materiaal achter

Er blijft geen asbesthoudend (verdacht) materiaal achter.

Resultaat

Visuele inspectie	Goedgekeurd
Luchtmeting FCM	Goedgekeurd

Niet geïnspecteerde delen / uitsluitingenAchter/onder afgeplakte delen m.u.v. de locaties van de gesaneerde toepassingen.
Kieren, naden en gaten tot een visuele diepte geïnspecteerd.*Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder onze voorafgaande toestemming*

Inspectie randvoorwaarden

Inspectietijd	21 minuten
Is er een werkplan met de relevante onderdelen aanwezig?	Ja
Containment geschikt voor inspectie?	Ja
Is het containment droog?	Ja
Is het containment stof vrij?	Ja
Is het containment voldoende verlicht?	Ja
Containment vrij van obstakels of verpakt afval?	Ja
Folie/stucloop op ondergrond aanwezig?	Ja
Onderdruk tijdens de meting verlaagd naar 5Pa?	Ja
Is het containment vrij van fixeermiddelen?	Ja

Resultaten**Segmenten**

Resultaten	Segmenten
	1
Locatie / bouwdeel	V
Constructiedelen (plafond, wanden)	V
Doorvoeringen	Nvt
Kabelgoten	Nvt
Ventilatiekanalen	Nvt
Buizen	V
Verwarmingselementen	Nvt
Kozijnen	Nvt
Plinten	Nvt
Vloer	V
Machines, installaties	Nvt
Deco-unit	V
Gereedschappen, hulpmiddelen, trappen,	Nvt
Achter gebleven inboedel	Nvt

V = op moment van inspectie in orde bevonden;

V (2) = op moment van inspectie in orde na aanvullende schoonmaak;

A = afgekeurd vanwege het aantreffen van asbestrestanten, gehele ruimte reinigen.

F/A = afgeplakt

N.v.t. = niet aanwezig

Opmerkingen

Geen opmerkingen.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder onze voorafgaande toestemming

Luchtmeting

Gem. vezelconcentratie (v/m ³)	<10000	
Ondergrens (v/m ³)	<10000	95% betrouwbaarheidsinterval
Bovengrens (v/m ³)	<10000	95% betrouwbaarheidsinterval
Conclusie luchtmeting	Goedgekeurd	
Monster nummer	1	2
Filternummer	F10	F11
Duur monstername (min)	120	120
Begin debiet (l/min)	8,3	8,3
Eind debiet (l/min)	8,2	8,1
Totaal volume (l)	990	984
Vezelconcentratie (v/m ³)	<10000	<10000
Ondergrens (v/m ³)	<10000	<10000
Bovengrens (v/m ³)	<10000	<10000



Opmerkingen

Vanwege de beperkte oppervlakte van het containment zijn de filterhouders dicht bij, elkaar en/of de wand en/of de vloer geplaatst.

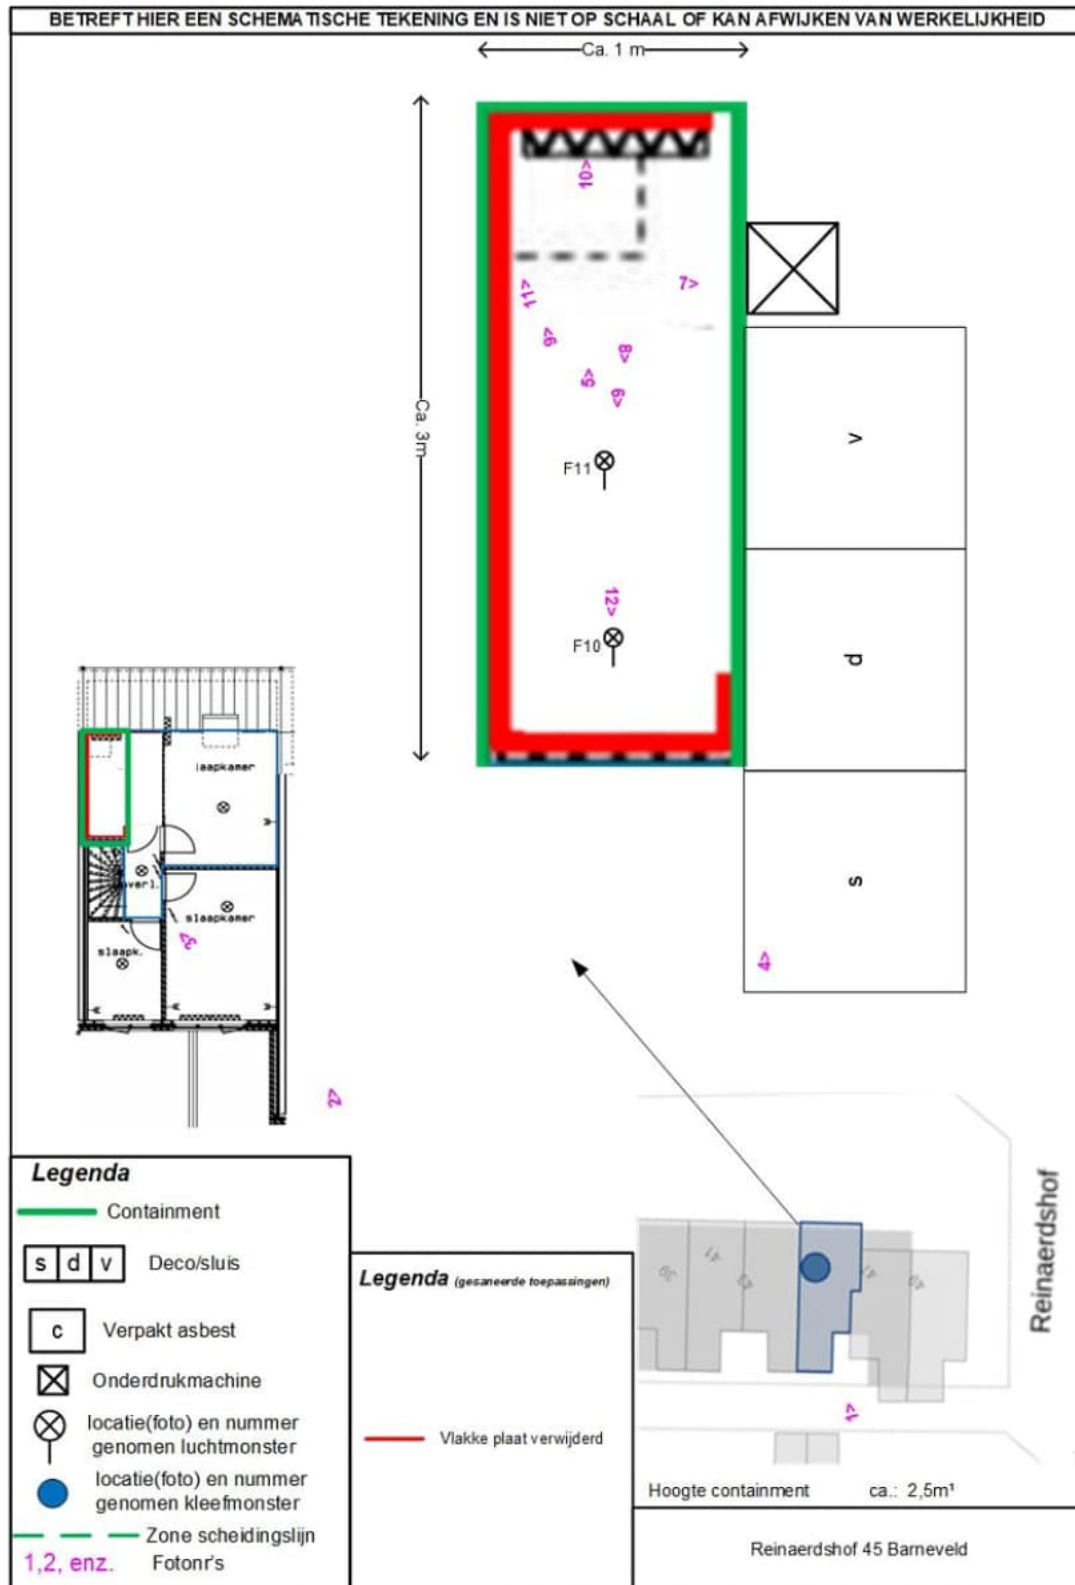
Eindconclusie

Op basis van bovenstaande resultaten kan geconcludeerd worden dat de gemiddelde respirabele vezelconcentratie in het containment, op het moment van de luchtmeting met een bovengrens van 95% betrouwbaarheidsinterval, onder de wettelijke norm van 10000 vezels/m³ valt.

Het containment voldoet aan de eisen conform NEN2990:2020+C1 en mag zonder adembescherming betreden worden.

Naam en handtekening inspecteur**Naam en handtekening DTA-er opdrachtgever**

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder onze voorafgaande toestemming

Tekening


Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder onze voorafgaande toestemming

Foto's

1. Overzichtsfoto



2. Overzichtsfoto



3. Onderdrukregistratie



4. Deco



5. Containment



6. Containment

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder onze voorafgaande toestemming



7. Onderdrukmaschine



8. Meetpunt pompen



9. Locatie verwijderd asbest



10. Locatie verwijderd asbest



11. Locatie verwijderd asbest



12. Locatie verwijderd asbest

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder onze voorafgaande toestemming
